Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

# ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ

№ 4 (10) 18 мая 2012г.

Газета Местной мусульманской религиозной организации
МАХАЛЛЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ» г.Ижевска Удмуртской Республики

## Строим вместе

АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!

За март - апрель 2012г. выполнен немалый объем работы по строительству Центральной мечети. В целом за этот период оплачено за выполненные работы и материалы 1 371 243руб. Часть этих денег - это расчет за работы, выполненные в предыдущем отчетном периоде. Так был произведен расчет с ООО «Оникс» за монтаж металлических элементов минаретов (200 тыс.руб.), расчет с ижевской строительной организацией за бетонирование минаретов (100 тыс.руб.).

За изготовление и монтаж лестничных ограждений произведен окончательный расчет - 94 130,55руб. из общей суммы по договору 470 654 руб.
Для оплаты этой работы Ижевский Муфтият в феврале 2012г. объявлял акцию по сбору пожертвований. АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин, по этой акции собрали 651 957,00 руб. Оставшаяся сумма 181303руб. будет оплачена за изготовление и монтаж поручней наверху на венчике минаретов. Спасибо всем, кто вложил деньги на эти работы! С этим номером газеты публикуем специальный вкладыш с именами тех, кто пожертвовал свои деньги и принял участие в акции. На сегодня практически эта работа закончена, т.е. смонтировано 60 п/м (погонных метров) перил на лестничных маршах в мужской и женской половине и возле окон.

В женском и мужском молельных залах полностью закончены покрасочные работы, в т.ч. выполнена художественная роспись потолков, гипсовых изделий, вентиляционных решеток и капителий. Кропотливую работу по росписи проделал художник Столяров В.А.

Специалисты Крафтпласта изготовили и установили 50 гипсовых решеток на вентиляционные отверстия воздуховодов.

1 марта 2012г. выполнен монтаж металлоконструкции с пирамидами на двух минаретах. Об этом историческом событии подробно было опубликовано в предыдущем номере нашей газеты № 3 (9) от 9 марта 2012г. После этого несколько дней окончательно и основательно приваривали металлические элементы и проводили контроль сварных соединений специалисты-сварщики ИКЦ «Альтон». Эта работа требовала высокой квалификации от исполнителей - специалистов.

Сейчас внутри минаретов по всей высоте смонтированы вертикальные лестницы и межпролетные площадки из металлического решетчатого материала для обслуживания различных коммуникаций. В каждом минарете установлены по 60 ступеней и 9 площадок.

По отопительной системе полов выполнено:

- монтаж разводки трубопроводов – 140 п/м;
- установка насосов – 6шт., электрокотла – 1шт., расширительных бачков – 2шт.;
- установка группы безопасности с воздухоотводчиками – 2 шт. и др.оборудование (мониторы, воздухоотводчики и предохранительные клапаны);
- испытание системы теплых полов на энергоэффективность центральной системы отопления через теплообменник. Результаты испытаний признаны удовлетворительными, система находится в рабочем состоянии.

На техническом этаже дверные откосы обшиты гипсокартоном с утеплителем (8 кв.м) и зашит гипсокартоном каркас теплового узла (15 кв.м).

На этом же этаже выполнена укладка на пол керамогранита - 13 кв.м, укладка 100 п/м плинтуса из керамогранита в обоих залах. Покрашены металлические пластины заземления – 2 п/м.

В тахаратных выполнена облицовка плиткой душевых поддонов (4 кв.м) и облицовка стен душевых пластиковыми панелями (2 кв.м).

В двух тамбурах первого этажа на площади 18кв.м сделана растворная стяжка и уложена на пол плитка и 12 п/м плинтуса.

Продолжение на странице 2

**Для перечисления средств на строительство мечети в г.Ижевске по ул.К.Маркса реквизиты:**
**Махалля «Центральная мечеть» г. Ижевска**
**ИНН 1841012334 КПП 184101001**
**р/с 40703810268000040736**
**Удмуртское отделение №8618 в г.Ижевске**
**к/с 30101810400000000601 БИК 049401601**
**В платежном поручении указать:**
**“Благотворительность на строительство мечети”**

Сайт Центральной мечети
www.izhevsk-mechet.ru
На сайте размещено видеообращение Председателя Махалли Центральной мечети Каюмова Н.Б. на русском и арабском языках, с переводом этого выступления на английский язык.

Перила на лестничных маршах.

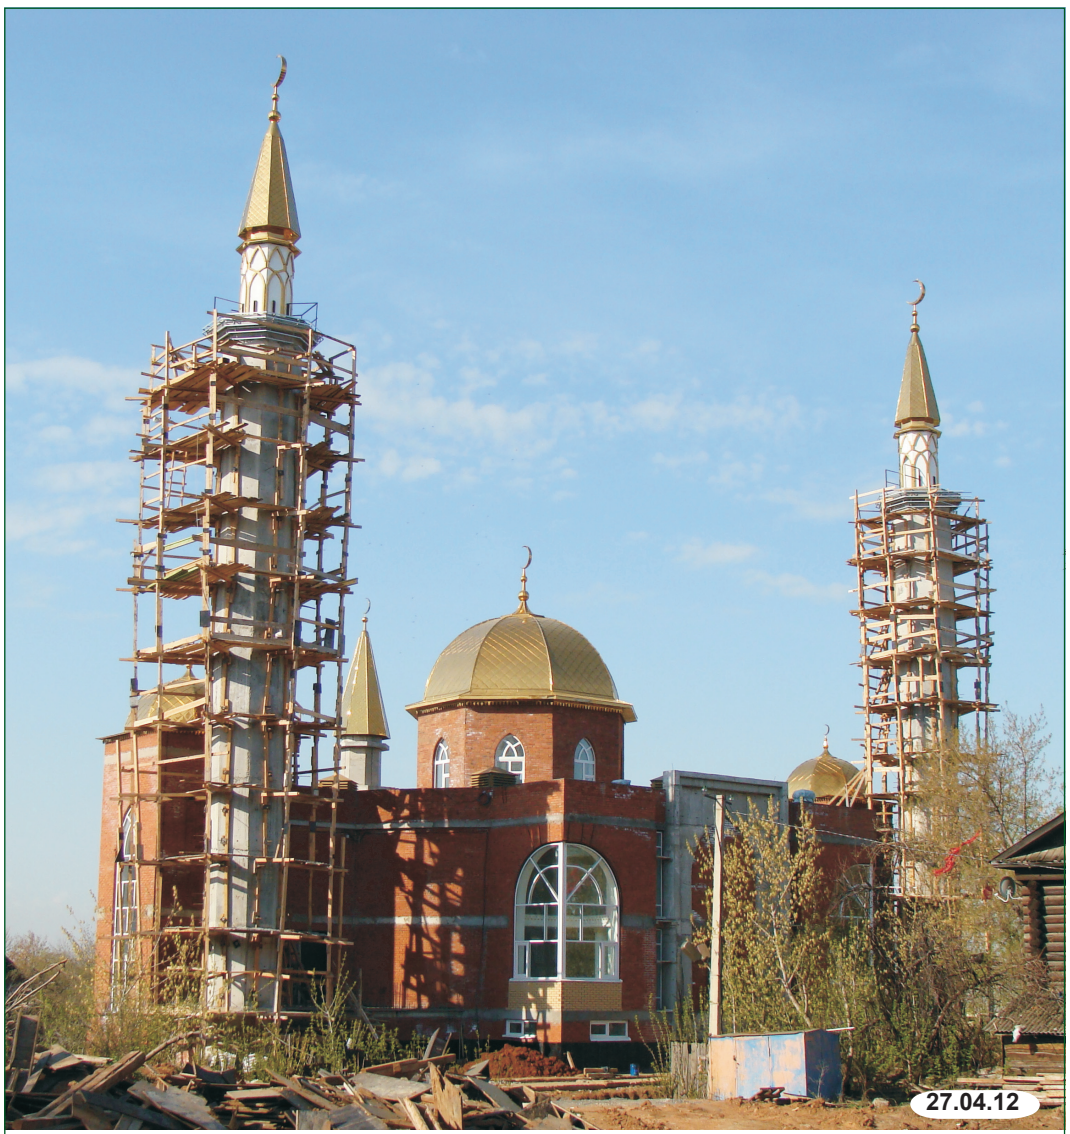

Вид мечети с северной стороны.

**Ступени и площадки из решетчатого материала внутри минарета и коммуникации.**

**Разводка трубопроводов отопительной системы полов.**

**Продолжение. Начало на странице 1**

На первом этаже выполнена укладка плинтуса 96п/м по периметру помещения.

Стены и потолки:

- на первом этаже выполнена покраска стен 300 кв.м и потолков 250 кв.м;
- покраска стен лестничных пролетов – 320 кв.м;
- покраска стен технического этажа – 500 кв.м.

Произведена:

- зашивка кабельканала гипсокартоном на лестничных маршах – 24 п/м;
- зашивка мест крепления радиаторов отопления к стене профилем – 48 мест;
- покраска труб отопительной системы – 500 п/м.

Электромонтажные работы:

- монтаж молниезащиты 60 п/м и устройство заземления металлических площадок 60 п/м внутри минаретов;
- установка светильников на техническом этаже – 66 шт.;
- установка люстр 8 шт. в женском зале;
- отделочные работы в электрощитовой (штукатурка, шпаклевание, покраска стен и потолков) выполнены бригадой электриков;
- предварительный замер петли «фаза – нуль» на всех этажах мечети – 20 точек.

Один мусульманин оплатил безвозмездно стоимость электрооборудования на сумму 100 тыс.руб.

Выполнено устройство гидроизоляции (150 кв.м) на нижней части стен снаружи здания мечети с применением праймера, битума и бикроста. Пазухи стен засыпаны глиной и утрамбованы (18куб.м).

По призыву имама мечети Закирова Ильсура добровольцы, АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин, приходят делать уборку территории и внутри мечети (мытье полов, окон, стеклянных ограждений, уборка мусора и др.). В таких вспомогательных работах всегда принимает участие Магдеев Равиль З.

В настоящее время ведется монтаж каркаса под обшивку венчика (карниза) на стыке бетонной верхней части минаретов с металлоконструкцией вершины минаретов.

Сейчас приступаем к наружным отделочным работам минаретов.

Начинаем выполнять довольно объемную работу по изготовлению и затратам - это обустройство пяти входных групп снаружи здания мечети:

- один центральный вход;
- два входа в женскую половину;
- два входа в мужскую половину.

О дверях.

Общее количество дверей в мечети будет 55 шт. Из них на сегодня установлены 7 дверей, отданных безвозмездно. Три двери изготовлены, но пока не установлены. Еще две двери привез один мусульманин. Остается изготовить и установить 43 двери (в т.ч. 16 дверей в кабины тахаратных). В апреле сделана предоплата 70 000 руб. за 7 противопожарных дверей.

В первую очередь нужно будет установить двери на входах в мужской и женский залы и на входе на первый этаж, чтобы уберечь от загрязнения и запыления покрашенные стены и потолки.

Сейчас ведутся подготовительные работы по прокладке канализации из кухни. Для этого разрабатывается проект с расчетом по прокладке соответствующих труб с учетом уклона рельефа для стока воды и врезки в городскую магистраль.

За последнее время строительство ни на один день не останавливается, АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин, мы с каждым днем продвигаемся вперед. Уважаемые мусульмане и все, кто не остается равнодушным, на нас с вами выпала ответственность по строительству Центральной мечети, и это великое благо. Некоторые люди хотели бы строить такую мечеть, но у них нет возможности, а у нас с вами есть иман, есть желание и, самое главное, мы чувствуем поддержку Всевышнего! Он вселяет в нас веру, дает нам силы и здоровье. Он объединяет нас с вами и указывает праведный путь! Каждый раз, когда заканчиваются деньги, находятся люди, которые вкладывают свои средства. Вот и сейчас, кроме собранных по акции, внесли деньги ООО «МК СВК» - 150 тыс.руб., ООО «Декоративно-цветочные культуры» - 100 тыс.руб., Хабибуллина Ирина Борисовна – 200тыс.руб., Ахметова Равиля Касимовна – 100 тыс.руб., ООО «Торговый Дом «АНИС» - 15 тыс.руб., и много других людей, о которых написано в Отчете по вкладам на странице 3. Радует еще и то, что наши женщины-мусульманки стали более активными в финансировании строительства. Они влияют на своих мужей, и от этого семейная дружба укрепляется, все получают от Всевышнего награду - сауаб.

Желаю всем вам, уважаемые мусульмане, мусульманки, уважаемые читатели нашей газеты, и тем, кто принимает участие в строительстве мечети, укрепления веры во Всевышнего, и мы просим Его, чтобы в наших семьях были мир и благополучие, а в сердцах - душевное спокойствие!

Председатель Махалли
Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР **Н.Б.Каюмов**

**Устройство гидроизоляции на нижней части наружной стены с северной стороны мечети.**

# Отчет по вкладам и расходам за март - апрель 2012г.

Благотворительные **вклады в кассу** Фонда
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | Поступление | Дата | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| | Остаток от предыдущих вкладов на 01.03.12г. | | **425 453,92** |
| 1 | Через Фазульянова Р.М. из ящика на стройплощадке (всего за март-апрель сдал в бухгалтерию 297 392,00руб., из них 218 960,00 руб. вложили на р/счет Фонда ) | апрель | 63 182,00 |
| | | март | 15 250,00 |
| 2 | Через Фардиева М.Ф. из ящика в мечети по ул.Азина (сдал в бухгалтерию за период с 28.02.12г. по 12.04.12г.) | 12.04.12 | 182 605,00 |
| 3 | Мусульманин (целевые для оплаты налогов за февраль - март) | 20.03.12 | 6 150,00 |
| | | 10.04.12 | 6 150,00 |
| 5 | Мусульманин (на оплату электроэнергии, отопления) | 22.03.12 | 58 500,00 |
| | | 23.04.12 | 28 000,00 |
| 6 | Мусульманин | 15.03.12 | 1 000,00 |
| | | 18.04.12 | 1 000,00 |
| 7 | Мухаметшина Хамида Салиевна | 05.04.12 | 1 000,00 |
| 8 | Гизатуллин Р.Х. | 06.03.12 | 100,00 |
| 9 | Мусульманин | 06.03.12 | 100,00 |
| 10 | Закиров И.А. возврат подотчетной суммы | 02.03.12 | 6000,00 |
| | **ИТОГО:** | | **794 490,92** |

**Расходы с расчетного счета** Фонда
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | За материалы и выполненные работы | Дата | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | МУП “Ижводоканал” за отпуск и прием воды | За март и апрель | 4 255,73 |
| 2 | ОАО “Удмуртская энергосбытовая компания” за электричество | | 31 500,00 |
| 3 | ООО “Удмуртские коммунальные системы” за отопление | | 70 000,00 |
| 4 | Обязательные платежи (алименты) | | 4 795,14 |
| 5 | Налоги | | 12300,00 |
| 6 | За обслуживание р/счета | | 1 575,20 |
| 7 | ООО АК “ЗАРЯ” за аудиторскую проверку | 26.04.12 | 5 500,00 |
| 8 | ООО “Энерком” за электрооборудование | 01.03.12 | 15 192,49 |
| 9 | ООО “Электросеть” за электромонтажные работы | 01.03.12 | 54 950,34 |
| 10 | ИП Фатыхов М.М. за монтаж каркаса и обшивку венчиков минаретов | 20.03.12 | 60 000,00 |
| 11 | ООО “ПромАвтоСервис” за услуги самосвала | 14.03.12 | 6 280,00 |
| 12 | ООО “СтройПартия” за керамзит, цемент | 26.04.12 | 12 880,00 |
| | **ИТОГО:** | | **279 228,90** |
| | **Остаток на р/сч на 30.04.12г.: 116,81 руб.** | | |

**Расходы из кассы** Фонда
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | Выполненные работы и материалы | Кто получил | Дата | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы (краска, расширительный бак, шпаклевка, насос) | Закиров И.А. | март-апрель | 62 299,70 | 143 205,60 |
| | Цемент, профили, гипсокартон, канат, металлическая полоска | | | 26 429,60 | |
| | Шлак и услуги погрузчика при уборке снега | | 02.03.12 | 15 100,00 | |
| | За услуги погрузчика при уборке снега для спецтехники при монтаже минаретов | | 02.03.12 | 4 500,00 | |
| | Хознужды (ключи, ремонт болгарки, мешки для мусора и др.) | | 16.04.12 | 1 771,90 | |
| | За обеды бригады, которая оформляла михраб | | 01.03.12 | 7 354,40 | |
| | За вывоз мусора и доставку глины | | апрель | 19 900,00 | |
| | За доставку материалов (керамзит, цемент, шпаклевка, гипсокартон, профиль, плитка и др.) | | март-апрель | 5850,00 | |
| 2 | Оплата работ: облицовка стен душевых панелями, облицовка душевых поддонов, обшивка дверных откосов гипсокартоном с утеплителем, установка вентиляционных решеток, гидроизоляция наружных стен, укладка плитки и плинтусов в тамбурах на 1 этаже | По ведомостям | 16.02.-29.01.12 | 22 242,68 | |
| | | | 01.03.12-15.03.12 | 18 880,00 | |
| | | | 16.03.-31.03.12 | 21 722,18 | |
| | | | 01.04.12-15.04.12 | 19 725,00 | |
| 3 | За обеды рабочим | По ведомостям | март-апрель | 13 000,00 | |
| 4 | За охрану мечети и стройплощадки | По ведомостям | за февраль | 29 000,00 | |
| | | | за март-апрель | 31 800,00 | |
| 5 | За устройство плинтуса, укладку керамогранита | Кодиров Н. | 16.03.12 | 14 580,00 | |
| 6 | Художественное оформление потолка, стен, капителей | Столяров В.А. | март | 20 000,00 | |
| | | | апрель | 26 000,00 | |
| 7 | Хознужды (канцтовары, почтовые расходы, бензин и др.) | Через Закирьянову Р.З. | 23.04.12 | 868,5 | |
| 8 | ООО «Оникс» за монтаж металлических частей минаретов | Через Закирьянову Р.З. | 02.03.12 | 100000,00 | |
| | **ИТОГО:** | | | **461 023,96** | |
| | **Остаток на 30.04.12г.: 333 466,96 руб.** | | | | |

**Вклады на** целевой расчетный счет **РДУМУ** на строительство мечети
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | Поступления | Дата | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток на р/сч на 01.03.12г. | | **25 041,07** | |
| 1 | Акция на лестничные ограждения За всю акцию собрано 651957,00 руб., из них в феврале: 51000,00руб. | Март | 549 657,00 | 600 957,00 |
| | | апрель | 51 300,00 | |
| 2 | ООО “МК СВК” | 30.03.12 | 150 000,00 | |
| 3 | ОАО “Декоративно-цветочные культуры” | 09.04.12 | 100 000,00 | |
| 4 | Хабибуллина Ирина Борисовна | 19.04.12 | 200 000,00 | |
| 5 | Ахметова Равиля Касимовна | 12.04.12 | 100 000,00 | |
| 6 | Аглязова Лукмана Аглязетдиновна | 04.04.12 | 1 000,00 | |
| 7 | Хохлова Салихжана | 06.04.12 | 1 000,00 | |
| 8 | Габидуллина Мансура Касимовна | 06.04.12 | 1 000,00 | |
| 9 | Зямилова Ильгиза Б. | 08.04.12 | 1 000,00 | |
| | **ИТОГО:** | | **1 179 998,07** | |

**Расходы** с целевого расчетного счета **РДУМУ**
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | За выполненные работы и материалы | Дата | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Строительная организация за минареты | 07.03.12 | 100 000,00 |
| 2 | ИП Фатыхов М.М. за монтаж каркаса и обшивку венчиков минаретов | 24.04.12 | 40 000,00 |
| | | 11.04.12 | 60 00,00 |
| 3 | ИП Фатыхов М.М. за изготовление и монтаж лестничных ограждений | 19.04.12 | 94 130,55 |
| 4 | ООО “Технология” за противопожарные двери (7 шт.) | 19.04.12 | 70 000,00 |
| 5 | ООО “УСК” за электромонтажные работы | 24.04.12 | 36 580,00 |
| 6 | Управление имущественных отношений Администрации г.Ижевска и ИФНС за аренду прилегающей территории по договору | январь-май | 112 740,50 |
| 7 | За обслуживание р/счета | | 1400,00 |
| | **ИТОГО:** | | **514 851,05** |
| | **Остаток на р/сч РДУМУ на 30.04.12г.: 665 147,02 руб.** | | |

**Вклады** на расчетный счет **Махалли «Центральная мечеть»**
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | Поступления | Дата | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| | Остаток на р/сч на 01.03.12г. | | **104 990,29** |
| 1 | ООО “Торговый дом “АНИС” | 14.03.12 | 15 000,00 |
| 2 | Нардинова Гульнара Раифовна | март-апрель | 200,00 |
| 3 | ИП Нуруллин Ленар Наргизович | март | 2 100,00 |
| | | апрель | 2 500,00 |
| 4 | Благотворительный взнос (имена не публикуют) | март-апрель | 200,00 |
| 5 | Хакимова Лейсан Гаптельахатовна | март-апрель | 300,00 |
| 6 | Бегишева Людмила Александровна | 26.03.12 | 100,00 |
| 7 | Пиров Р.С. | 02.03.12 | 500,00 |
| 8 | Калимуллина Марина Александровна | 27.04.12 | 500,00 |
| | **ИТОГО:** | | **126 390,29** |

**Вклады на расчетный счет** Фонда
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | Поступления | Дата | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| | **Остаток на р/сч на 01.03.12г.** | | **53 009,21** |
| 1 | Через Фазульянова Р.М. из ящиков со стройплощадки мечети | март | 153 310,00 |
| | | апрель | 65 650,00 |
| 2 | ООО Полюс-НПО | 21.03.12 | 5 000,00 |
| 3 | Взносы граждан через ОАО «Уральский трастовый банк» | март-апрель | 346,50 |
| 4 | Бадахшина Алина Тафкиловна | 06.03.12 | 2 030,00 |
| | **ИТОГО:** | | **279 345,71** |

**Расходы с** расчетного счета **Махалли «Центральная мечеть»**
за период с **01.03.12г. по 30.04.12г.**

| № | Выполненные работы и материалы | Дата | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Оникс» за монтаж металлических частей минаретов | 02.03.12 | 100 000,00 |
| 2 | ООО “Технониколь” за бикрост | 18.04.12 | 15 376,28 |
| 3 | За обслуживание р/счета | март-апрель | 763,00 |
| | **ИТОГО:** | | **116 139,28** |
| | **Остаток на р/сч на 30.04.12г.: 10 251,01 руб.** | | |

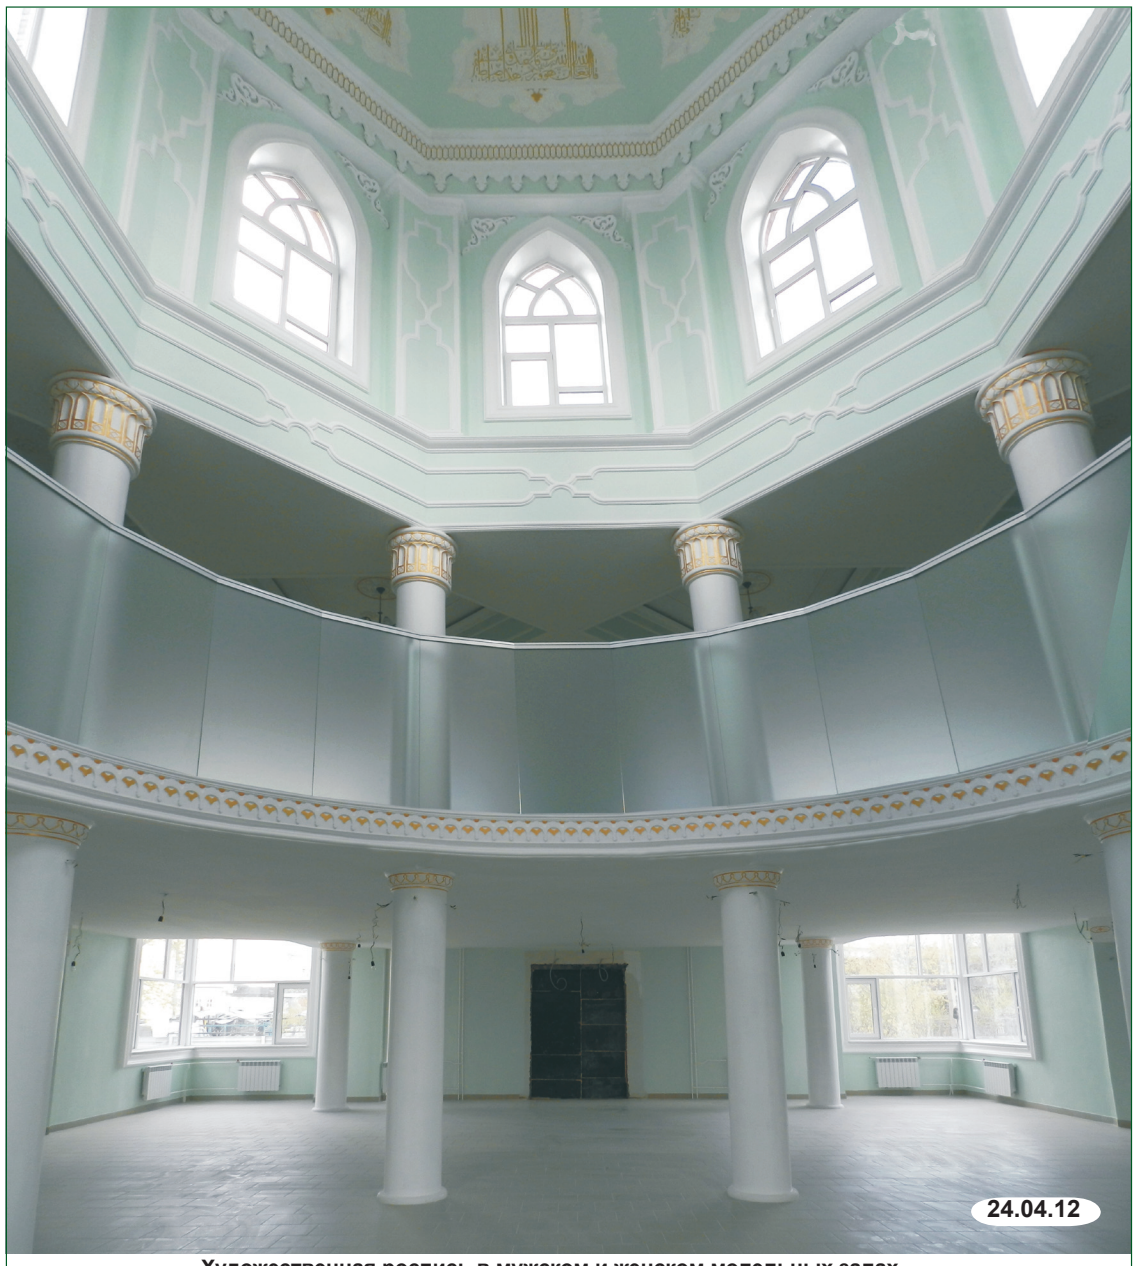


Художественная роспись в мужском и женском молельных залах.

Потолочные светильники на техническом этаже.

Люстры в женском зале.

*Расписание намазов на 18 - 31 мая 2012г.*

| Дата | День | Утренний | Восход | Дневной | Пред-вечерний | Вечерний | Ночной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Пт | 2:33 | 4:03 | 12:45 | 17:58 | 20:45 | 22:15 |
| 19 | Сб | 2:31 | 4:01 | 12:45 | 17:35 | 20:47 | 22:17 |
| 20 | Вс | 2:30 | 4:00 | 12:45 | 18:00 | 20:49 | 22:19 |
| 21 | Пн | 2:28 | 3:58 | 12:45 | 18:01 | 20:51 | 22:21 |
| 22 | Вт | 2:26 | 3:56 | 12:45 | 18:02 | 20:53 | 22:23 |
| 23 | Ср | 2:25 | 3:55 | 12:45 | 18:03 | 20:54 | 22:24 |
| 24 | Чт | 2:23 | 3:53 | 12:45 | 18:04 | 20:56 | 22:26 |
| 25 | Пт | 2:22 | 3:52 | 12:45 | 18:05 | 20:58 | 22:28 |
| 26 | Сб | 2:20 | 3:50 | 12:45 | 18:06 | 20:59 | 22:29 |
| 27 | Вс | 2:19 | 3:49 | 12:45 | 18:07 | 21:01 | 22:31 |
| 28 | Пн | 2:17 | 3:47 | 12:45 | 18:08 | 21:03 | 22:33 |
| 29 | Вт | 2:16 | 3:46 | 12:45 | 18:09 | 21:04 | 22:34 |
| 30 | Ср | 2:15 | 3:45 | 12:45 | 18:09 | 21:06 | 22:36 |
| 31 | Чт | 2:13 | 3:43 | 12:45 | 18:10 | 21:07 | 22:37 |

*Расписание намазов на июнь 2012г.*

| Дата | День | Утренний | Восход | Дневной | Пред вечерний | Вечерний | Ночной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пт | 2:12 | 3:42 | 12:45 | 18:11 | 21:08 | 22:38 |
| 2 | Сб | 2:11 | 3:41 | 12:45 | 18:12 | 21:10 | 22:40 |
| 3 | Вс | 2:10 | 3:40 | 12:45 | 18:12 | 21:11 | 22:41 |
| 4 | Пн | 2:09 | 3:39 | 12:45 | 18:13 | 21:12 | 22:42 |
| 5 | Вт | 2:08 | 3:38 | 12:45 | 18:14 | 21:14 | 22:44 |
| 6 | Ср | 2:07 | 3:37 | 12:45 | 18:14 | 21:15 | 22:45 |
| 7 | Чт | 2:07 | 3:37 | 12:45 | 18:15 | 21:16 | 22:46 |
| 8 | Пт | 2:06 | 3:36 | 12:45 | 18:16 | 21:17 | 22:47 |
| 9 | Сб | 2:05 | 3:35 | 12:45 | 18:16 | 21:18 | 22:48 |
| 10 | Вс | 2:05 | 3:35 | 12:45 | 18:17 | 21:19 | 22:49 |
| 11 | Пн | 2:04 | 3:34 | 12:45 | 18:17 | 21:20 | 22:50 |
| 12 | Вт | 2:04 | 3:34 | 12:45 | 18:18 | 21:21 | 22:51 |
| 13 | Ср | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:19 | 21:21 | 22:51 |
| 14 | Чт | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:19 | 21:22 | 22:52 |
| 15 | Пт | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:19 | 21:23 | 22:53 |
| 16 | Сб | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:19 | 21:23 | 22:53 |
| 17 | Вс | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:20 | 21:24 | 22:54 |
| 18 | Пн | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:20 | 21:24 | 22:54 |
| 19 | Вт | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:20 | 21:24 | 22:54 |
| 20 | Ср | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 21 | Чт | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 22 | Пт | 2:03 | 3:33 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 23 | Сб | 2:04 | 3:34 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 24 | Вс | 2:04 | 3:34 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 25 | Пн | 2:04 | 3:34 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 26 | Вт | 2:05 | 3:35 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 27 | Ср | 2:06 | 3:36 | 12:45 | 18:21 | 21:25 | 22:55 |
| 28 | Чт | 2:06 | 3:36 | 12:45 | 18:21 | 21:24 | 22:54 |
| 29 | Пт | 2:07 | 3:37 | 12:45 | 18:21 | 21:24 | 22:54 |
| 30 | Сб | 2:08 | 3:38 | 12:45 | 18:21 | 21:23 | 22:53 |

Орнамент на колоннах и по периметру потолка на первом этаже.

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя!

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация Махалля «Центральная мечеть» г. Ижевска Удмуртской Республики.
Отпечатано: ООО “Парацельс Принт”, г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а
Тираж 999 экз. Заказ № 620. Распространяется бесплатно.
